

LLDD BE - Data Migration and Cutover

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	43 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบการย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (Oracle FCS_FRN ฝั่ง FGI/FCS + SQL Server CPA_FRN_FGI ฝั่ง K2) เข้าสู่ target schema ของ SGI พร้อมแผน cutover, reconcile และ rollback

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Source-to-target mapping ระดับตาราง/คอลัมน์ (ORA FCS_FRN · MSSQL CPA_FRN_FGI -> 21 ตาราง)
- การแปลงคีย์: polymorphic TRANSACTION_PK -> typed FK · CompDocumentID -> doc_no · IMPACT_PROCESS_ID -> impact_process_id
- แผน cutover เป็นรอบ (dry-run -> delta -> freeze -> final) และ rollback
- Reconcile: นับแถว ยอดเงิน และ checksum ต่อโซน
- การย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่เข้าสู่ @srm/glb-workflow
- ระบุข้อกำหนดด้าน migration ที่ต้องยึดตอนย้ายข้อมูลจริง

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Data Migration and Cutover




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Data Migration and Cutover

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Data Migration and Cutover

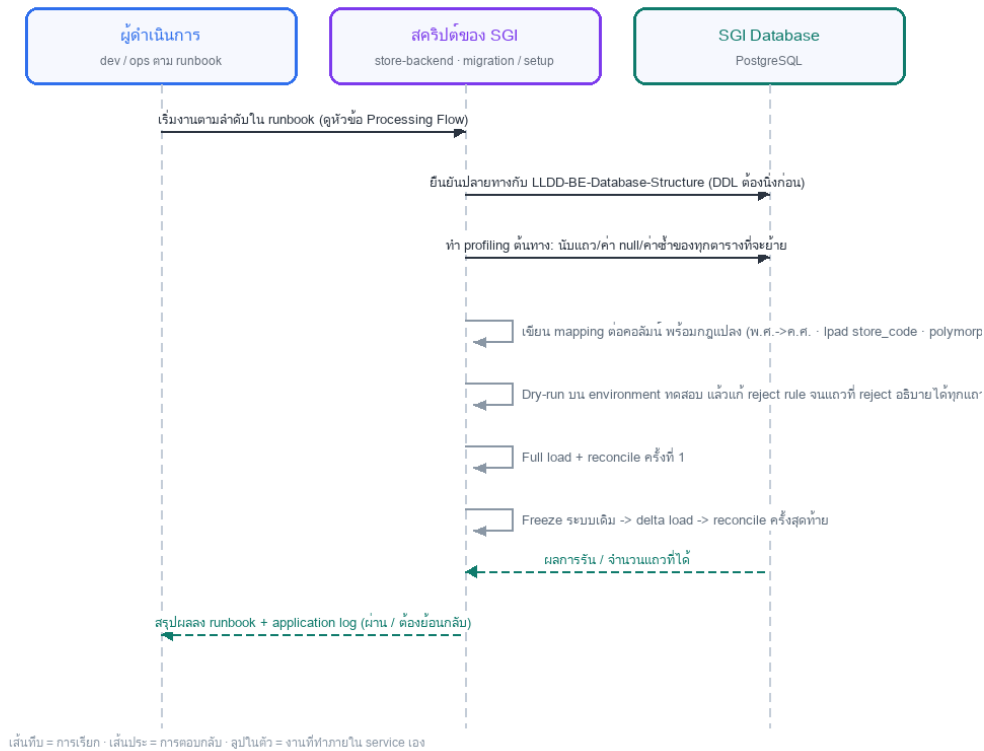

รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Data Migration and Cutover

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
source ORA	Oracle FCS_FRN	read-only ตอน migrate	ฝั่ง FGI/FCS pipeline (FGI_IMPACT_* · FCS_QSSI_SCORE · FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
source MSSQL	SQL Server CPA_FRN_FGI	read-only ตอน migrate	ฝั่ง K2 document (CompensateFlow · CompensateHistory · ImpactProfile · ImpactCostDetail · RunningNumber)
business key	impacted_store_code + month + year	ต้อง unique หลังแปลง	ใช้เป็นคีย์ dedup ตอน load โชน A
doc_no	YYYY/xxxxx (ค.ศ. · มติ 2026-08-06)	ต้อง unique	แปลงจาก CompDocumentID — ถ้าของเดิมเป็น พ.ศ. ต้องแปลงเป็น ค.ศ. ตอน migrate · ตั้งค่า sgi_document_running_numbers.last_running_no ต่อปี (ค.ศ.) ให้ตรงกับเลขสูงสุดที่ย้ายมา
date	เก็บเป็น ค.ศ. ใน DB	แปลงจาก พ.ศ. ของระบบเดิมด้วย toAD()	FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น
store_code	VARCHAR(5)	lpad 5 หลัก	ระบบเดิมบางตารางเก็บเป็นตัวเลข ทำให้ leading zero หาย

5.1 Source-to-Target Mapping ระดับตาราง

ต้นทาง	ระบบ	ปลายทาง (SGI)	กฎแปลงที่ต้องระวัง
FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS	ORA FCS_FRN	sgi_fgi_impact_processes	PK IMPACT_PROCESS_ID (seq SEQ_FGI_IMPACT_PROCESS) เป็น hub ของทั้งโซน A · ต้อง migrate คอลัมน์รอบชดเชยด้วย (gap F8 · รับเข้าโครง 2026-08-21): LAST_COMPENSATE_SEQ/_SEQ_NO -> last_compensate_seq/_seq_no · START/END_COMPENSATE_MONTH-YEAR -> start/end_compensate_month/year · FLAG_ACTION -> flag_action · DATASOURCE -> datasource · ▲ FLAG_ACTION โดเมนจริงคือ Y/W/N (active = IN ('Y', 'W')) ไม่ใช่ Y/N — Job 6 เขียน Y->W ตอนพัก/รอจ่าย ถ้า CHECK ปลายทางรับแค่ Y/N แยกกลุ่มนี้จะ migrate ไม่ผ่าน · ทั้ง 4 กลุ่มนี้คือค่าที่ Job 8b ใช้ตัดสินใจเข้า flow
FGI_IMPACT_STORE	ORA FCS_FRN	sgi_fgi_impact_stores + sgi_impacted_stores	แถวฝั่ง _I ทำ distinct เข้า sgi_impacted_stores · ที่เหลือเป็นคู่ร้าน · คอลัมน์ที่รับเข้าโครง 2026-09-02: FLAG_VERIFY -> verify_status (W/P/N ตรงตัว) · CREATE_BY -> created_by / UPDATE_BY -> updated_by (โดเมน ALM/STA/USER — ค่าอื่นในข้อมูลเดิมต้อง map เป็น USER และรายงานจำนวน) · CREATE_DATE -> created_at (กฎ "ตัดทิ้งเมื่อเก่ากว่า 12 เดือน" ของ Job 2 อ้างคอลัมน์นี้ — ห้ามใส่ค่า sysdate ตอน migrate ไม่งั้นแถวเก่าจะไม่ถูกตัดทิ้ง)
FGI_IMPACT_STORE_COMPENSATE	ORA FCS_FRN	sgi_fgi_impact_compensations (รับเข้าโครง 2026-08-21 · gap F1)	COMPENSATE_FORECAST -> forecast_amount · COMPENSATE_ADJUST -> adjust_amount · COMPENSATE_SEQ/_SEQ_NO -> compensate_seq/_seq_no · UK (impact_process_id, compensate_month) · ใช้นับยอด 0 ติดกันก็งวดด้วย COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0 — เป็น input ของ Job 8b ชั้นที่ 2 ของเคส ② ต่อเนื่อง
FGI_IMPACT_STORE_INFO	ORA FCS_FRN	sgi_compensation_documents (+ approver_snapshot JSONB)	ตกหล่นจากตารางนี้จนถึง 2026-09-13 — ตรวจสอบจริงแล้วมี 429 แถว · เก็บ snapshot ร้านที่ถูกกระทบ + ผู้อนุมัติ ณ เวลาเปิดเอกสาร · เอกสาร batchjob/JOB-08 ระบุปลายทางไว้แล้วแต่ไม่เคยถูกยกมาที่แผน migration
FGI_NEW_STORE_INFO	ORA FCS_FRN	sgi_document_new_stores	ตกหล่นจากตารางนี้จนถึง 2026-09-13 — ตรวจสอบจริงแล้วมี 492 แถว · ร้านเปิดใหม่ที่ผูกกับเอกสาร (ดู batchjob/JOB-09)

ต้นทาง	ระบบ	ปลายทาง (SGI)	กฎแปลงที่ต้องระวัง
FGI_NEW_STORE_COMPENSATE	ORA FCS_FRN	sgi_document_new_stores (%ชดเชย ต่อร้านใหม่)	ตกหล่นจากตารางนั้นจนถึง 2026-09-13 — ตรวจสอบฐานจริงแล้วมี 473 แถว · สัดส่วน %ชดเชยต่อร้านใหม่ ซึ่งกติกาบังคับว่ารวมกันต้องได้ 100% พอดี — ต้อง reconcile หลัง load
FGI_WS_LOG	ORA FCS_FRN	— ไม่ migrate (ตัดทิ้งโดยตั้งใจ)	▲ ตรวจสอบจริง 2026-09-13 พบ 20,704 แถว และถูกใช้ในโค้ด Java เดิม 4 ไฟล์ — ไม่ใช่ "ตารางที่เสนอไว้" อย่างที่เคยเขียนไว้ · ระบบใหม่ใช้ integration_log ของ SBP เดิม ทำหน้าที่นี้แทน (log payload ราย call) ส่วน ACK ระดับแถวอยู่ที่ sgi_interface_transactions_log เดิมไม่ถูกยกมา — ถ้าต้องสืบย้อนต้องเปิดฐานเดิมอ่านเอง ต้องยืนยันว่ารับได้
FGI_IMPACT_STORE_SALES	ORA FCS_FRN	sgi_fgi_impact_sales_summaries	key STORECODE_I + MONTH + YEAR
FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN	ORA FCS_FRN	sgi_sales_transactions	4 หน้าต่าง × 15 วัน — ห้ามใช้ fcs_monthly_sales แทน (รายเดือนย้อนกลับเป็นรายวันไม่ได้)
FGI_IMPACT_COMPETITOR	ORA FCS_FRN	sgi_fgi_impact_competitors	data_source = ALM
FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA	ORA FCS_FRN	sgi_interface_transactions	TRANSACTION_PK เป็น polymorphic — ต้องแตกตาม DATA_NAME เป็น typed FK
FCS_QSSI_SCORE	ORA FCS_FRN	fcs_qssi_score (sps_store)	ปลายทางมีข้อมูลอยู่แล้ว 24,284,545 แถว — ไม่ต้อง migrate เพราะ SGI อ่านอย่างเดียว ห้ามโหลดทับ
CompensateFlow	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_compensation_documents	CompDocumentID -> doc_no · เก็บ round_no/loop_no/allmap_url /statement_id/approver_snapshot
CompensateHistory	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_consideration_logs	PK ActionID · เพิ่ม result_category (APPROVE/REJECT/CANCELLED/PENDING)
ImpactProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_document_new_stores	ฝั่ง_N + %ชดเชย/ยอดต่อร้าน
CompetInCompenProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_document_competitors	คู่แข่งที่ผูกกับเอกสาร · competitor_store_code = รหัสสาขาจาก ALLMAP (ไม่มี FK) · brand_code อ้าง master sgi_competitors (11 รหัส 01-11) · แถวที่มาจาก ALLMAP ตั้ง data_source = ALM
FactorInCompenProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_document_external_factors	ปัจจัยภายนอกที่ผูกกับเอกสาร · factor_code อ้าง master sgi_external_factors + ช่วงวันที่มีผล
FGI_IMPACT_STORE_COMPENSATE + CompensateFlow	ORA + MSSQL	sgi_compensation_histories	ประวัติชดเชยต่อร้าน/รอบ · submit_account_month (งวดที่ Job 6 ส่งไป STA ผ่าน RabbitMQ) · migrate เป็นข้อมูลอ้างอิงของ SGI — ไม่เขียนกลับ fr_store_insure ของระบบเดิม
ImpactCostDetail	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_document_cost_details	ยอดชดเชยแยกรายเดือน/รายร้านใหม่
RunningNumber	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_document_running_numbers	ตั้ง last_running_no ต่อปีให้ตรงกับเลขสูงสุดที่ย้ายมา

ต้นทาง	ระบบ	ปลายทาง (SGI)	กฎแปลงที่ต้องระวัง
CompDocAttachment / CompTempAttachment / AttachFileProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_document_attachments	metadata เท่านั้น · ไฟล์จริงต้องย้ายขึ้น S3 ของระบบเดิม
FactorProfile / CompetitionProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	sgi_external_factors / sgi_competitors	เป็น master ที่ SGI เป็นเจ้าของ · DecisionProfile ไม่ย้ายมาแล้ว — มติ DP-9 (2026-08-10) ให้ seed ลง common_code ของระบบเดิม (code_type = SGI_DECISION) ไม่สร้างตาราง decisions

5.2 กฎแปลงข้อมูลที่ผัดบอย

เรื่อง	อาการถ้าไม่ทำ	กฎที่ต้องใช้
ค่าที่ติด CHECK constraint	load ล้มทั้ง batch — DDL มี CHECK 26 จุด ถ้าข้อมูลเดิมมีค่านอกโดเมนแม่แถวเดียว INSERT จะถูกปฏิเสธ	profile ค่าจริงของทุกคอลัมน์ที่มี CHECK ก่อน full load (SELECT DISTINCT col, COUNT(*) ... GROUP BY col) แล้วเทียบกับโดเมนใน DDL · จุดที่เสี่ยงที่สุด: compensate_status · verify_status จาก FLAG_VERIFY · sales_request_status — ทั้งสามยืนยันจากข้อมูลจริงแล้ว ดูตารางแม่ในข้อ 5.2.1 · created_by/updated_by จาก CREATE_BY/UPDATE_BY (ALM/STA/USER — ค่าอื่นให้ map เป็น USER แล้วรายงานจำนวน) · flag_action (Y/W/N) · data_name (12 คำ) · ห้ามแก้ด้วยการถอด CHECK ออก — ให้แก้ค่าหรือขยายโดเมนอย่างตั้งใจพร้อมอัปเดต Database design
leading zero ของรหัสร้าน	ร้าน 00788 กลายเป็น 788 แล้ว join ไม่ติด	lpad(store_code, 5, '0') ทุกจุด · ปลายทางเป็น VARCHAR(5)
ปี พ.ศ./ค.ศ.	วันที่เพี้ยน 543 ปี	เก็บ ค.ศ. ใน DB และ doc_no เป็นปี ค.ศ. ด้วย (มติ 2026-08-06) · ถ้าของเดิมเป็น พ.ศ. ต้องแปลงตอน migrate ด้วย toAD()
polymorphic key	FK ชี้ผิดตาราง	แตก TRANSACTION_PK ตาม DATA_NAME เป็น impact_process_id / sales_summary_id / doc_no
เลขเอกสารซ้ำ	ออกเลขใหม่ทับของเก่า	หลังโหลด ตั้ง sgi_document_running_number s.last_running_no = MAX(running) ต่อปี
ยอดขายรายวัน	ข้อมูล 60 วันไม่ครบ ทำให้ธงผิดปกติเพี้ยน	ต้องมาจาก FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN เท่านั้น · fcs_monthly_sales (711,384 แถว) ใช้ cross-check ได้อย่างเดียว

5.2.1 ตารางแม่ค่าสถานะตอน migrate (ยืนยันจากฐานเดิมจริง)

ตัวเลขทั้งหมดมาจากการ profile ฐาน Oracle ของระบบเดิมเมื่อ 2026-09-12 (tools/introspect_legacy_oracle.py · ตาราง
FGI_IMPACT_STORE_BK_20250515 26,264 แถว และ FGI_IMPACT_STORE_SALES_BK_20250515 8,730 แถว — ตาราง
live ถูกรีเซตเมื่อ 2025-05-15 จึงมีแค่ 728 แถว ใช้เป็นภาพแทนไม่ได้) · แถวที่ยังไม่เคยทำให้ load ล้มทั้ง batch เพราะทั้งไฟล์อยู่ใน
transaction เดียว

ค่าเดิม	จำนวนแถวจริง	แม่เป็นอะไรในโครงใหม่	สถานะ
FGI_IMPACT_STORE.FLAG_VE RIFY = N	14,424	verify_status = 'N'	✓ ตรงตัว
FGI_IMPACT_STORE.FLAG_VE RIFY = Y	8,556	verify_status = 'P' + sales_request_status = 'Y' — ค่าเดียวของเดิมถือสองความหมาย (ผ่านการตรวจคู่ร้าน และ ยอดขายผ่านแล้ว) โครงใหม่แยกเป็นสองคอลัมน์	● ต้องเคาะ — แม่ตรงตัวจะติด CHECK ทันที 8,556 แถว

ค่าเดิม	จำนวนแถวจริง	แมปเป็นอะไรในโครงใหม่	สถานะ
FGI_IMPACT_STORE.FLAG_VERIFY = W	3,064	verify_status = 'W'	✓ ตรงตัว
FGI_IMPACT_STORE.FLAG_VERIFY = P	220	verify_status = 'P'	✓ ตรงตัว
FGI_IMPACT_STORE_SALES.FLAG_VERIFY = Y	6,029	sgi_fgi_impact_sales_summaries.sales_status = 'Y'	✓ ตรงตัว
FGI_IMPACT_STORE_SALES.FLAG_VERIFY = N	2,549	sgi_fgi_impact_sales_summaries.sales_status = 'N' — N = ประเมินแล้วยอดไม่ตก (growth_rate_diff >= 0) ไม่ใช่ความผิดพลาด จึงแมปเป็น E ไม่ได้	✓ เคาะแล้ว (ข้อ 2.37) — โดเมนเดิมมี N อยู่แล้ว
FGI_IMPACT_STORE_SALES.FLAG_VERIFY = P	151	sgi_fgi_impact_sales_summaries.sales_status = 'P' (ขอแล้วรอผล) — โดเมนเดิมไม่มี P จึงเพิ่มเข้าไป เป็น W/P/Y/N/E	✓ เคาะแล้ว (ข้อ 2.37)
FGI_IMPACT_STORE_SALES.FLAG_VERIFY = W	1	sales_status = 'W'	✓ ตรงตัว
sgi_fgi_impact_stores.sales_request_status	—	ไม่มีต้นทางในระบบเดิม — เป็นคอลัมน์ใหม่ที่ติดตาม *การขอ* ยอดขายระดับคู่ร้าน (W ยังไม่ขอ · P ขอแล้ว · Y ได้ข้อมูล · E ขอไม่สำเร็จ) คนละเรื่องกับ sales_status ที่เป็น *ผลทางธุรกิจ* จึงไม่มี N	※ ไม่เกี่ยวกับ migration
sales_status = E	0	ไม่เคยถูกใช้เลยในระบบเดิม — สงวนไว้สำหรับกรณีที่ Job 5 คำนวณไม่ได้จริง ๆ	※ ค่าใหม่ของโครงนี้
CREATE_BY = USER	0	ไม่เคยถูกใช้เลย — ALM 23,126 · STA 3,138	※ ค่าใหม่ของโครงนี้
UPDATE_BY	NULL ทั้ง 26,264 แถว	updated_by เป็น NULL ได้อยู่แล้ว	✓ ไม่มีปัญหา
DATASOURCE	ALM 4,670 · STA 2,877	datasource ตรงตัว — ไม่มี HRS จริง	✓ ไม่มีปัญหา
FLAG_ACTION	N 7,545 · Y 2 · W 1	flag_action ตรงตัว (Y/W/N)	✓ ไม่มีปัญหา

5.2.2 คีย์กันซ้ำที่ทำให้ load ล้ม (ยืนยันจากฐานเดิมจริง)

คีย์ของโครงใหม่	ข้อมูลเดิมละเมิดกี่กลุ่ม	ต้องทำอะไรก่อน load
uq_impact_store_pair (impacted_store_code, new_store_code, impact_month)	67 กลุ่ม ในข้อมูลประวัติ · 93 กลุ่ม ในตาราง live	แถวซ้ำส่วนใหญ่เหมือนกันทุกค่า (COUNT(DISTINCT distance) = 1) ต่างแค่ IMPACT_STORE_ID → เลือกแถวเดียวด้วยกติกาเดียวกับ tie-breaker ของ Job 2 (DISTANCE น้อยสุด) แล้วรายงานจำนวนที่ตัดทิ้ง
uq_impact_process (impacted_store_code, impact_month)	9 กลุ่ม (ข้อมูลประวัติ) · 8 กลุ่ม (live)	✓ เคาะครบแล้ว (ข้อ 2.38-2 · 2026-09-13) — impact_month = START_COMPENSATE_YEAR+MONTH · กติกาเลือกแถวอยู่ในหัวข้อ 5.2.4 ด้านล่าง (ตัดสินครบ 9/9 กลุ่ม) · การเติม datasource เข้าคีย์ ไม่ช่วยเลย (ยังซ้ำ 9 กลุ่มเท่าเดิม)
storecode_i / storecode_n → VARCHAR(5)	0 (ความยาวจริงสูงสุด = 5 ทั้งที่คอลัมน์เดิมเป็น VARCHAR2(10))	ไม่ต้องทำอะไร — แต่ต้องคง lpad(..., 5, '0') ไว้
distance_km → NUMERIC(8,3)	0 (ของเดิมเป็น NUMBER(3,2) ค่าจริง 0.03–1.52 กม.)	ไม่ต้องแปลงหน่วย — ของเดิมเก็บเป็นกิโลเมตรอยู่แล้ว · ▲ แถว CREATE_BY = 'STA' 3,137 แถวมี DISTANCE = 0 และหน่วยเป็น NULL

5.2.3 การสร้างแถวแม่ `sgi\_fgi\_impact\_processes` ตอน migrate

โครงใหม่บังคับให้ร้านค้าทุกแถวต้องมีแถวแม่ (impact_process_id BIGINT NOT NULL + FK) แต่ระบบเดิมสร้าง FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS เฉพาะตอนที่รอบชดเชยเริ่มจริง (ExportJdbc · หลังร้านค้าผ่านเป็น P และยอดขายผ่านแล้ว) — ไม่ใช่ตอนนำเข้า ผลคือร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีแถวแม่ในระบบเดิม และ migration ต้อง สร้างขึ้นใหม่

ตัวเลขจากข้อมูลจริง	ค่า
ร้านค้าในระบบเดิม	26,264 แถว
แถวแม่ที่โครงใหม่ต้องมี = DISTINCT (storecode_i, year, month) ของร้านค้า	24,783 แถว
แถวแม่ที่ระบบเดิมมีจริง	7,548 แถว (3,143 ร้าน)
แถวแม่ที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ตอน migrate	• 17,247 แถว (69.6%)
แถวแม่ที่ไม่มีร้านค้ารองรับเลย	0 — สร้างจากร้านค้าได้ครบ ไม่มีของตกหล่น

กติกการสร้าง — สองชั้น ห้ามสลับลำดับ

ชั้น	ทำอะไร
1	สร้างแถวแม่จาก SELECT DISTINCT storecode_i, year, month FROM FGI_IMPACT_STORE → impacted_store_code · impact_month = to_char(year) '-' lpad(month,2,'0') · impact_year = year
2	LEFT JOIN FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS ด้วย (storecode_i, start_compensate_year, start_compensate_month) แล้วชนคุณสมบัติของรอบมา: flag_action · datasource · last_compensate_seq · last_compensate_seq_no · start/end_compensate_month year

• สองข้อที่ยังต้องเคาะและผูกกับข้อนี้โดยตรง — 17,247 แถวที่สร้างใหม่จะได้ค่าอะไร:

คอลัมน์	ปัญหา	ผลถ่วงผิด
flag_action	✓ เคาะแล้ว 2026-09-13 (ข้อ 2.38) — 17,247 แถวที่สร้างใหม่ใส่ 'N' (ยังไม่มีรอบชดเชย) · แถวที่มีต้นทางให้ชน flag_action เดิมมาตรง ๆ	ใช้กติกาเดียวกับ Job 2 ที่รันจริง (ใส่ 'N' ชัดเจน ไม่ทิ้ง DEFAULT 'Y') — ตั้ง Y ผิด ๆ จะทำให้คิวรี "คู่ที่มีอยู่แล้ว" กันร้านค้าใหม่ออกเงียบ ๆ
process_status	✓ เคาะแล้ว (ข้อ 2.17) — IMPORTED / SALES_READY / READY_DOCUMENT / DOCUMENT_CREATED / CLOSED · DDL มี DEFAULT 'IMPORTED' แล้ว	ใช้กติกาอนุมานในตารางถัดไป — ห้ามใส่ IMPORTED ให้ทุกแถว เพราะ 8,114 แถวมีความคืบหน้าไปแล้วจริง

กติกาก่อนอนุมาน process_status ตอน migrate — ไล่จากบนลงล่าง เจอข้อแรกที่จริงแล้วหยุด (ตัวเลขจากข้อมูลจริง 2026-09-12)

ลำดับ	เงื่อนไข	process_status	แถว
1	แถวแม่เดิมมี FLAG_ACTION = 'N' (รอบปิดแล้ว)	CLOSED	7,542
2	มีแถวใน FGI_IMPACT_STORE_C OMPENSATE ของงวดนั้น (เคยสร้างเอกสารแล้ว)	DOCUMENT_CREATED	572
3	มีแถวแม่เดิมอยู่ แต่ยังไม่เข้าข้อ 1-2	READY_DOCUMENT	0
4	มี FGI_IMPACT_STORE_SALES ของงวดนั้นที่ FLAG_VERIFY IN ('Y', 'N')	SALES_READY	2,498
5	นอกนั้นทั้งหมด (ส่วนใหญ่คือร้านค้าที่ถูกตัดทิ้งหรือค้าง W)	IMPORTED	14,180

▲ ผลรวมของตารางนี้คือ 24,792 แต่แถวแม่ที่ต้องมีคือ 24,783 — ต่างกัน 9 แถว พอดีกับ จำนวนกลุ่มแถวแม่ที่ซ้ำ การ LEFT JOIN จึงคืนแถวเกิน · ✓ แก้ด้วยการตัดแถวซ้ำตามกติกาในข้อ 5.2.4 ก่อน แล้วจึงอนุมาน process_status (ตัดแล้วได้ 24,783 พอดี)

5.2.4 กติกาตัดแถวแม่ที่ซ้ำ (`uq\_impact\_process`)

มติ 2026-09-13 (DECISIONS ข้อ 2.38-2): เก็บแถวที่ LAST_COMPENSATE ใหม่สุด แต่ข้อมูลจริงบอกว่าเกณฑ์เดียวไม่พอ — ตัดสินได้แค่ 2 จาก 9 กลุ่ม เพราะอีก 7 กลุ่ม เหมือนกันทุกคอลัมน์ จึงต้องมี tie-breaker ต่ออีก 2 ชั้น

ชั้น	เกณฑ์	เหตุผล
1	last_compensate_year DESC, last_compensate_month DESC	มติหลัก — แถวที่ก้าวหน้ากว่าสะท้อนสถานะล่าสุดจริง · ตัดสินได้ 2 กลุ่ม
2	create_date ASC	ข้อมูลจริงจับคู่กันเป็น 00:00:00 (แถว backfill ที่ใส่ด้วยมือ/สคริปต์) กับ 17:00:xx (แถวที่ job สร้างตามตาราง) · ทั้ง 2 กลุ่มที่ชั้น 1 ตัดสินได้ แถว backfill เป็นผู้ชนะ การเรียง ASC จึงสอดคล้องกัน · ตัดสินอีก 7 กลุ่ม
3	impact_process_id ASC	กันเสมอเด็ดขาด — ผลต้อง deterministic รันกี่ครั้งก็ได้แถวเดิม

ยืนยันกับข้อมูลจริง: กติกา 3 ชั้นนี้ ตัดสินครบทั้ง 9 กลุ่ม (9/9) เหลือผู้ชนะกลุ่มละ 1 แถว และตัดทิ้ง 9 แถว — ทำให้จำนวนแถวแม่ลงตัวที่ 24,783 พอดี (ก่อนหน้านี้ตารางอนุมาน process_status ในข้อ 5.2.3 รวมได้ 24,792 เพราะ LEFT JOIN คืนแถวเกิน 9)

แถวลูกของแถวที่ถูกตัด — ลบทิ้งได้ ไม่ต้อง repoint

ตรวจ	ผล
แถวแม่ที่ถูกตัด	9 แถว
แถวลูกใน FGI_IMPACT_STORE_COMPENSATE ของแถวที่ถูกตัด	20 แถว
แถวลูกของแถวที่เก็บไว้ (เฉพาะกลุ่มที่ซ้ำ)	20 แถว
ลูกของแถวที่ถูกตัด ที่ไม่มีคู่งวดเดียวกันฝั่งผู้ชนะ	0 แถว
คู่ที่ชนกัน 20 คู่ · compensate_status ตรงกัน	20 จาก 20 คู่

→ ลูกของแถวที่ถูกตัดเป็น สำเนาซ้ำของลูกฝั่งผู้ชนะทั้งหมด (งวดตรงกัน สถานะตรงกัน) จึง ลบทิ้งพร้อมแถวแม่ได้เลย ไม่เสียข้อมูล และไม่ต้องย้าย FK

▲ ผลข้างเคียงที่ต้องยอมรับ: last_compensate_seq_no ของแถวที่เก็บไว้จะกระโดด (เช่น กลุ่ม 02985 งวด 2024-03 เก็บแถว seq_no = 13 แล้วทิ้งแถว seq_no = 4) เลขลำดับในระบบใหม่จึงไม่ต่อเนื่อง — ห้าม renumber เพราะจะทำให้อ้างอิงย้อนหลังกับระบบเดิมไม่ตรง

5.3 แผน Cutover

รอบ	กิจกรรม	เกณฑ์ผ่าน
T-14 วัน	Profiling ต้นทาง + dry-run รอบที่ 1	อธิบายแถวที่ reject ได้ทุก reason code
T-7 วัน	Full load บน staging + reconcile	จำนวนแถว/ยอดเงินตรง หรืออธิบายส่วนต่างได้
T-2 วัน	ซ้อม cutover เต็มรูปแบบรวม rollback	rollback สำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง
T-0 (freeze)	หยุดใช้ระบบเดิม -> delta load -> reconcile รอบสุดท้าย -> ย้าย workflow ที่ยังวิ่ง	ทุกเอกสารที่ยังไม่จบ flow เปิดในระบบใหม่ได้ที state เดิม
T+1..T+7	เผื่อระวัง · เก็บ snapshot ก่อน cutover ไว้	ไม่มีเอกสารที่หาไม่เจอ/สถานะเพี้ยน

5.4 การย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่

เอกสารที่ยังไม่จบ flow ต้องถูกเปิด transaction ใหม่ใน @srm/glb-workflow ให้อยู่ state ปัจจุบัน — ไม่ใช่เริ่มต้นที่ state แรก
ขั้นตอนที่ต้องทำต่อเอกสาร: initializeWorkflow -> เดิน event จนถึง state ปัจจุบัน หรือ set current_state_id/current_status_id/current_approver โดยตรง แล้วเติม workflow_history ย้อนหลังจาก CompensateHistory เพื่อให้ timeline ไม่ขาด · เขียนผ่าน API ของ library เท่านั้น ห้าม INSERT ตารางของ engine ตรง เพราะ engine ไม่มี API สำหรับ set state ตรง ๆ

5.5 ข้อกำหนดด้าน migration ที่ต้องยึด

ตารางนี้คือข้อกำหนดที่ต้องทำตาม ไม่ใช่ทางเลือก — ทุกข้อสอดคล้องกับ Database design / Workflow design / API design ซึ่งเป็นแหล่งความจริงของระบบ

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
fcs_qssi_score	ไม่มีอะไรต้อง migrate — SGI อ่านตารางเดิมอย่างเดียว ไม่ต้อง dedup/backfill	ระบบ SBP เดิมนำเข้าให้แล้ว (ปิด 2026-08-24 · ตัด Job 1)
ร้าน SP	migrate เฉพาะร้านที่เคยเข้ารอบชดเชยเข้ามาเป็น snapshot ใน sgi_impacted_stores	กันเอกสารย้อนหลังอ่านไม่ได้เมื่อร้านถูกยกเลิก (ตัดสินใจ 2026-08-10)
reference_id ของ workflow	ตอน backfill ให้ผูกด้วย sgi_compensation_documents.id (ส่งเป็น string)	ตรงกับสัญญาของ engine (varchar(255)) และแพตเทิร์นของระบบเดิม (ปิด 2026-08-17)
ลำดับการ import	master โชน C → โชน A (sgi_fgi_impact_processes ก่อนลูกทั้งหมด) → โชน B (sgi_compensation_documents ก่อน sgi_document_*) → เปิด workflow ผ่าน engine เป็นขั้นสุดท้าย	FK ของโชน B ชี้กลับโชน A และตารางลูกทั้ง 6 FK ไป doc_no แบบ NOT NULL

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user_context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม
Progress	ยืนยันปลายทางกับ LLDD-BE-Database-Structure.pdf (DDL ต้องนิ่งก่อน); ทำ profiling ต้นทาง: นับแถว/ค่า null/ค่าซ้ำของทุกตารางที่จะย้าย; เขียน mapping ต่อคอลัมน์ พร้อมกฎแปลง (พ.ศ.->ค.ศ. · lpad store_code · polymorphic key -> typed FK); Dry-run บน environment ทดสอบ แล้วแก้ reject rule จนแถวที่ reject อธิบายได้ทุกแถว
Output	20 target tables (โชน A/B/C)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	ออกแบบการย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (Oracle FCS_FRN ผัง FGI/FCS + SQL Server CPA_FRN_FGI ผัง K2) เข้าสู่ target schema ของ SGI พร้อมแผน cutover, reconcile และ rollback	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	จำนวนแถวปลายทางเท่าต้นทางทุกตาราง หรืออธิบายส่วนต่างได้ทุกแถว

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ยืนยันปลายทางกับ LLDD-BE-Database-Structure.pdf (DDL ต้องนิ่งก่อน)	dry-run แล้วรายงาน reject อธิบายได้ครบทุก reason code
2	ทำ profiling ต้นทาง: นับแถว/ค่า null/ค่าซ้ำของทุกตารางที่จะย้าย	full load + reconcile ผ่านบน dataset จริงชุด staging
3	เขียน mapping ต่อคอลัมน์ พร้อมกฎแปลง (พ.ศ.->ค.ศ. · lpad store_code · polymorphic key -> typed FK)	delta load ซ้ำ 2 รอบต้อง idempotent (ไม่เกิดแถวซ้ำ)
4	Dry-run บน environment ทดสอบ แล้วแก้ reject rule จนแถวที่ reject อธิบายได้ทุกแถว	ทดสอบร้านที่ store_code ขึ้นต้นด้วย 0

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
5	Full load + reconcile ครั้งที่ 1	ทดสอบเอกสารที่มีหลายรอบ (round_no/loop_no) ว่าลำดับไม่สลับ
6	Freeze ระบบเดิม -> delta load -> reconcile ครั้งสุดท้าย	ทดสอบ rollback: restore snapshot แล้วระบบเดิมกลับมาใช้งานได้
7	ย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่: initialize transaction ใน @srm/glb-workflow ให้ตรง state ปัจจุบันของเอกสาร	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)
8	เปิดระบบใหม่ · เก็บ snapshot ก่อน cutover ไว้สำหรับ rollback ตามหน้าต่างที่ตกลง	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ @srm/glb-workflow ตามขีด Detail ของ **TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2** — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ย้ายเอกสารที่ค้างกลางทาง	initializeWorkflow แล้ว eventWorkflow เข้าจนถึง state ปัจจุบัน	versionId, referenceld, ลำดับ event ตามสถานะเดิมใน K2	ห้าม INSERT workflow_transaction ตรงเพื่อ 'ตั้ง state ให้ตรง' — ต้องเดิน event จริงเพื่อให้ history ครบ · ต้อง rerun ได้ (referenceld เดิมไม่สร้าง instance ซ้ำ)

- กติกาหลัก: ตาราง sps_store.workflow_* (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง WorkflowGateway ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceld เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Dry-run migrate	runbook	สคริปต์ ETL โหมด --dry-run	ได้รายงานจำนวนแถว/แถวที่ reject โดยไม่เขียนปลายทาง
Full load	runbook	สคริปต์ ETL โหมด --full	โหลดข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเข้า target schema
Delta load	runbook	สคริปต์ ETL โหมด --delta --since	โหลดเฉพาะรายการที่เปลี่ยนหลัง full load
Reconcile	runbook	สคริปต์ reconcile	เทียบจำนวนแถว/ยอดเงินต้นทาง-ปลายทางต่อโซน
Rollback	runbook	restore snapshot ก่อน cutover	กลับไปใช้ระบบเดิมได้ภายในหน้าต่างที่ตกลง

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
ORA FCS_FRN (FGI_IMPACT_* · FCS_QSSI_SCORE · FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)	R	ต้นทางฝั่ง FGI/FCS
MSSQL CPA_FRN_FGI (CompensateFlow · CompensateHistory · ImpactProfile · ImpactCostDetail · RunningNumber)	R	ต้นทางฝั่ง K2 document
20 target tables (โซน A/B/C)	W	ปลายทางตาม DDL ของ LLDD-BE-Database-Structure.pdf
workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history (sps_store)	W (ผ่าน lib)	เปิด transaction ให้เอกสารที่ยังไม่จบ flow ด้วย initializeWorkflow() + addPreApprover() — ห้าม INSERT ตรง แม้เป็นสคริปต์ย้ายข้อมูล
fcs_monthly_sales (sps_store)	R	ใช้ cross-check ยอดขายรายเดือนเท่านั้น — แทนยอดขายรายวันไม่ได้

9. Processing Flow

Step	Description
1	ยืนยันปลายทางกับ LLDD-BE-Database-Structure.pdf (DDL ต้องนิ่งก่อน)
2	ทำ profiling ต้นทาง: นับแถว/ค่า null/ค่าซ้ำของทุกตารางที่จะย้าย
3	เขียน mapping ต่อคอลัมน์ พร้อมกฎแปลง (พ.ศ.->ค.ศ. · lpad store_code · polymorphic key -> typed FK)
4	Dry-run บน environment ทดสอบ แล้วแก้ reject rule จนแถวที่ reject อธิบายได้ทุกแถว
5	Full load + reconcile ครั้งที่ 1
6	Freeze ระบบเดิม -> delta load -> reconcile ครั้งสุดท้าย
7	ย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่: initialize transaction ใน @srm/glb-workflow ให้ตรง state ปัจจุบันของเอกสาร
8	เปิดระบบใหม่ · เก็บ snapshot ก่อน cutover ไว้สำหรับ rollback ตามหน้าตาที่ตกลง

10. Acceptance Criteria

- จำนวนแถวปลายทางเท่าต้นทางทุกตาราง หรืออธิบายส่วนต่างได้ทุกแถว
- ยอดเงินชุดเซียร์รวมต้นทาง = ปลายทาง (เทียบต่อปีและต่อร้าน)
- ไม่มี store_code ที่ leading zero หาย
- ไม่มี doc_no ซ้ำ และ sgi_document_running_numbers ต่อปีตรงกับเลขสูงสุดที่ย้ายมา
- เอกสารที่ยังไม่จบ flow เปิดในระบบใหม่แล้วอยู่ state เดิมและมีผู้อนุมัติปัจจุบันถูกคน
- มี rollback plan ที่ทดสอบแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	dry-run แล้วรายงาน reject อธิบายได้ครบทุก reason code
2	full load + reconcile ผ่านบน dataset จริงชุด staging
3	delta load ซ้ำ 2 รอบต้อง idempotent (ไม่เกิดแถวซ้ำ)
4	ทดสอบร้านที่ store_code เริ่มต้นด้วย 0
5	ทดสอบเอกสารที่มีหลายรอบ (round_no/loop_no) ว่าลำดับไม่สลับ
6	ทดสอบ rollback: restore snapshot แล้วระบบเดิมกลับมาใช้งานได้
